

# 北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事月報①

2025(令和7)年10月1日現在

## 〇トンネル工事の過去1か月間の進捗状況

トンネル工区	延長 (m)	覆工延長 (m)	掘削延長 (m)	掘削の進捗率	過去1か月の掘削延長 (m)	過去1か月の工事状況				
						前々回	前回	今回		
札幌	桑園	346	0	188	54%	3	●	●	●	(*1)
	札幌	8,446	0	2,412	29%	191	●	●	●	8月下旬に泥土地表漏出により掘進停止したが、9月上旬より掘進再開。
	富丘	4,500	1,523	3,765	84%	99	●	●	●	2切羽で掘削中。小樽方は概ね想定通りの進捗、札幌方は現地の状況により進捗が低下。
	星置	3,300	848	2,118	64%	116	●	●	●	
	銭函	5,100	732	2,783	55%	51	●	●	●	2切羽で掘削中。
	石倉	4,506	624	3,083	68%	0	●	●	●	9月から作業坑への段取替。11月下旬から本坑掘削再開予定。
朝里	4,328	3,060	4,201	97%	33	●	●	●	トンネル本坑の大断面拡幅部を掘削中。	
後志	天神	4,460	3,170	3,958	89%	95	●	●	●	
	塩谷	4,050	1,241	4,043	99%	37	●	●	●	地質不良区間を2切羽で掘削中。
	北上沢	4,600	4,543	4,600	100%	-	-	-	-	
	落合	4,865	4,826	4,865	100%	-	-	-	-	
ニツ森	明治	3,255	1,718	2,838	87%	112	●	●	●	
	尾根内	4,615	3,344	4,615	100%	-	-	-	-	
	鹿子	4,780	4,748	4,780	100%	-	-	-	-	
羊蹄	比羅夫	5,569	3,499	4,370	78%	113	●	●	●	
	有島	4,166	1,599	2,849	68%	16	●	●	●	中間立坑にてピットを交換中。到達立坑からのNATM掘削は所定位置に到達し、岩塊調査のための水平ボーリング実施中。
	ニセコ	2,250	2,250	2,250	100%	-	-	-	-	
昆布	宮田	5,710	5,742	5,710	100%	-	-	-	-	※宮田トンネルを含む。
	桂台	4,800	4,769	4,800	100%	-	-	-	-	
	幌内	5,000	4,960	5,000	100%	-	-	-	-	
内浦	東川	5,000	1,944	3,895	78%	75	●	●	●	
	静狩	5,570	4,095	5,570	100%	13	●	●	●	9月2日に隣接工区に到達
	国縫	1,340	1,340	1,340	100%	-	-	-	-	
豊野	2,165	2,120	2,165	100%	-	-	-	-	※幌内トンネルを含む。	
立岩	豊津	2,065	1,950	2,065	100%	-	-	-	-	
	ルコツ	5,000	5,000	5,000	100%	-	-	-	-	
	山崎	4,960	4,705	4,960	100%	-	-	-	-	
	立岩	5,015	4,977	5,015	100%	-	-	-	-	
野田追	北	4,450	3,402	4,450	100%	-	-	-	-	
	南	3,775	3,650	3,775	100%	-	-	-	-	
	祭礼	1,975	1,950	1,975	100%	-	-	-	-	
磐石	北	3,150	3,046	3,150	100%	-	-	-	-	
	二股	3,100	3,063	3,100	100%	-	-	-	-	※磐石トンネル(南)を含む。
	上ノ湯	5,300	4,395	5,139	97%	119	●	●	●	
渡島	上二股	4,540	2,380	4,540	100%	-	-	-	-	
	北鶉	5,510	3,886	5,510	100%	-	-	-	-	
	南鶉	3,900	747	2,095	54%	59	●	●	●	地質不良が継続中。2切羽で掘削中。
	天狗	4,600	2,688	4,332	94%	37	●	●	●	台場山工区側への長尺ボーリング実施中。
	台場山	3,500	668	1,812	52%	48	●	●	●	地質不良が継続中。3交代(24時間)体制で掘削中。
村山	5,365	5,365	5,365	100%	-	-	-	-		
合計	168,926	114,562	148,480	88%						

### 進捗率

	延長	契約率	掘削率
土木工事	211.9km	99%	88%

### 土木工事(トンネル、橋りょう・高架橋等)の状況

本坑掘削完了	23工区
本坑掘削中	17工区
橋りょう・高架橋等工事施工中	20工区
計	60工区

### 発生土受入地確保状況

	対策土	無対策土	合計
確保率	90%	99%	96%

※現時点で想定している発生量に対する確保割合。発生量は地質や工事の状況により変更となる可能性があります。

※当月におけるトンネルの掘削が、●概ね想定通り、●想定を下回り難航、●停止中(計画に則る停止を除く)であることを示します。

※●は、2024(令和6)年5月時点において3~4年程度の遅れが生じており、工程を重点的に管理している工区を示します。

※■のバーは掘削が完了している工区です。


\*1過去1か月の掘削延長は、トンネル区間の進捗率から換算しています。

※札幌トンネル札幌工区の覆工延長は二次インパット延長を示します。



## 橋りょう、高架橋等の工事

工区名	延長	進捗率 (先月比)	工事状況			
			Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
札幌車両基地高架橋	1,344m	48% (+1)	●	●	●	—
札幌トンネル(桑園)他	659m	46% (+10)	●	●	●	●
新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	39% (+8)	●	●	●	—
明治高架橋他	976m	54% (+5)	●	●	●	—
琴平高架橋	3,395m	30% (+3)	●	●		
倶知安駅高架橋	3,160m	48% (+2)	●	●	●	
岩尾別高架橋	2,354m	53% (+5)	●	●	●	—
宮田高架橋外1箇所	1,136m	45% (+1)	●	●	●	●
静狩路盤 ※高架橋を含む	4,390m	42% (+3)	●	●	●	●
共立路盤 ※高架橋を含む	3,921m	63% (+4)	●	●	●	●
栄原高架橋	2,534m	69% (+4)	●	●	●	—
長万部駅高架橋	2,319m	22% (+1)	●	●	●	—
平里高架橋他	1,838m	60% (+2)	●	●	●	—
中ノ沢高架橋	1,876m	65% (+4)	●	●	●	—
花岡高架橋	2,639m	69% (+11)	●	●	●	—
国縫高架橋	2,138m	34% (+1)	●	●	●	—
遊楽部高架橋	1,083m	57% (+3)	●	●	●	—
新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	66% (+1)	●	●	●	—
大新高架橋外1箇所	2,883m	64% (+1)	●	●	●	●
市渡高架橋他	461m	100% (+1)	■	■	■	■
JR委託工事						
札幌駅高架橋	799m	—	●	●	●	—

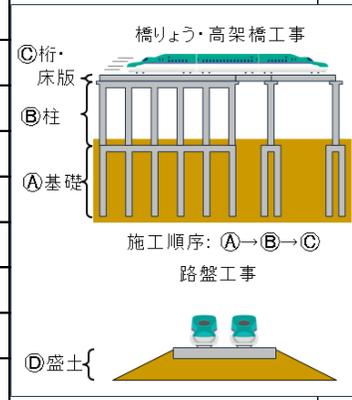

凡例 空欄:未着手 ●:施工中 ■:施工完了 —:対象なし
