


北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事月報①

2026(令和8)年2月1日現在

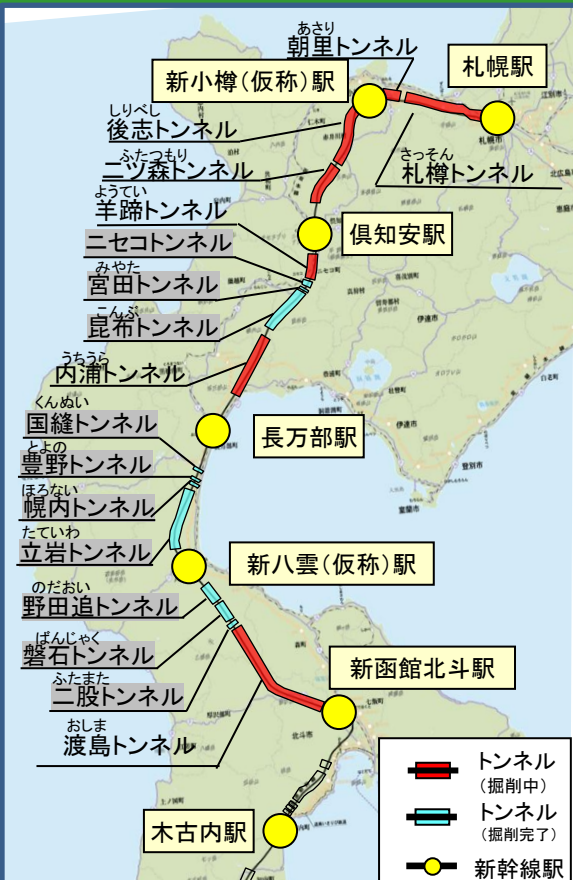

○トンネル工事の過去1か月間の進捗状況

トンネル工区	延長 (m)	覆工延長 (m)	掘削延長 (m)	掘削の進捗率	過去1か月の掘削延長 (m)	過去1か月の工事状況				
						前々回	前回	今回		
札幌	桑園	346	0	196	57%	1	●	●	●	(*1)
	札幌	8,446	0	3,027	36%	44	●	●	●	ビット引抜き点検及び交換が完了。1月下旬から試験掘進開始。
	富丘	4,500	1,962	4,116	91%	62	●	●	●	2切羽で掘削中。小樽方は概ね想定通りの進捗、札幌方は現地の状況により進捗が低下。
	星置	3,300	1,215	2,512	76%	81	●	●	●	
	銭函	5,100	1,056	3,082	60%	82	●	●	●	小樽方掘削中、札幌方段取替、2月上旬から掘削再開予定。
	石倉	4,556	780	3,209	70%	77	●	●	●	
朝里	4,328	3,111	4,246	98%	0	●	●	●	トンネル本坑の大断面インバート部を掘削中。	
後志	天神	4,460	3,482	4,235	95%	51	●	●	●	
	塩谷	4,050	1,536	4,050	100%	-	-	-	-	
	北上沢	4,600	4,543	4,600	100%	-	-	-	-	
二ツ森	落合	4,865	4,826	4,865	100%	-	-	-	-	
	明治	3,255	2,102	3,201	98%	60	●	●	●	
	尾根内	4,615	3,380	4,615	100%	-	-	-	-	
羊蹄	鹿子	4,780	4,748	4,780	100%	-	-	-	-	
	比羅夫	5,569	3,883	4,701	84%	143	●	●	●	
	有島	4,166	1,623	2,867	69%	0	●	●	●	中間立坑にてビットを交換中。区間A②の岩塊を撤去中。
ニセコ	2,250	2,250	2,250	100%	-	-	-	-		
昆布	宮田	5,710	5,742	5,710	100%	-	-	-	-	※宮田トンネルを含む。
	桂台	4,800	4,769	4,800	100%	-	-	-	-	
	幌内	5,000	4,960	5,000	100%	-	-	-	-	
内浦	東川	5,000	2,100	4,157	83%	59	●	●	●	
	静狩	5,570	4,382	5,570	100%	-	-	-	-	
	国縫	1,340	1,340	1,340	100%	-	-	-	-	
豊野	2,165	2,120	2,165	100%	-	-	-	-	※幌内トンネルを含む。	
立岩	豊津	2,065	1,950	2,065	100%	-	-	-	-	
	ルゴツ	5,000	5,000	5,000	100%	-	-	-	-	
	山崎	4,960	4,827	4,960	100%	-	-	-	-	
野田追	立岩	5,015	4,977	5,015	100%	-	-	-	-	
	北	4,450	3,570	4,450	100%	-	-	-	-	
	南	3,775	3,661	3,775	100%	-	-	-	-	
磐石	祭礼	1,975	1,950	1,975	100%	-	-	-	-	
	北	3,150	3,157	3,150	100%	-	-	-	-	
	二股	3,100	3,085	3,100	100%	-	-	-	-	※磐石トンネル(南)を含む。
渡島	上ノ湯	5,300	4,691	5,300	100%	-	●	-	-	
	上二股	4,540	2,923	4,540	100%	-	-	-	-	
	北鶉	5,510	4,096	5,510	100%	-	-	-	-	
	南鶉	3,900	891	2,332	60%	61	●	●	●	地質不良が継続中。2切羽で掘削中。
	天狗	4,600	2,940	4,491	98%	48	●	●	●	地質不良区間を概ね計画通りの進捗で掘削中。
	台場山	3,500	668	2,011	57%	46	●	●	●	地質不良区間が局所的に出現。3交代(24時間)体制で掘削中。
村山	5,365	5,365	5,365	100%	-	-	-	-		
合計	168,976	119,657	152,332	90%						

進捗率

	延長	契約率	掘削率
土木工事	211.9km	99%	90%

土木工事(トンネル、橋りょう・高架橋等)の状況

本坑掘削完了	25工区
本坑掘削中	15工区
橋りょう・高架橋等工事施工中	20工区
計	60工区

発生土受入地確保状況

	対策土	無対策土	合計
確保率	90%	99%	96%


※現時点で想定している発生量に対する確保割合。発生量は地質や工事の状況により変更となる可能性があります。

※当月におけるトンネルの掘削が、●概ね想定通り、●想定を下回り難航、●停止中(計画に則る停止を除く)であることを示します。
 ※ ■ は、2024(令和6)年5月時点において3~4年程度の遅れが生じており、工程を重点的に管理している工区を示します。
 ※ ■ のバーは掘削が完了している工区です。
 ※札幌トンネル札幌工区の覆工延長は二次インバート延長を示します。 *1 過去1か月の掘削延長は、トンネル区間の進捗率から換算しています。



橋りょう、高架橋等の工事

工区名	延長	進捗率 (先月比)	工事状況			
			①	②	③	④
札幌車両基地高架橋	1,344m	58% (+0)	●	●	●	—
札幌トンネル(桑園)他	659m	51% (+1)	■	●	●	●
新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	55% (+3)	●	●	●	—
明治高架橋他	976m	61% (+0)	●	●	●	—
琴平高架橋	3,395m	42% (+0)	●	●		
倶知安駅高架橋	3,160m	53% (+0)	●	●	●	
岩尾別高架橋	2,354m	64% (+1)	●	●	●	—
宮田高架橋外1箇所	1,136m	54% (+0)	●	●	●	●
静狩路盤 ※高架橋を含む	4,390m	49% (+1)	●	●	●	●
共立路盤 ※高架橋を含む	3,921m	84% (+0)	●	●	●	●
栄原高架橋	2,534m	79% (+3)	●	●	●	—
長万部駅高架橋	2,319m	25% (+0)	●	●	●	—
平里高架橋他	1,838m	70% (+1)	●	●	●	—
中ノ沢高架橋	1,876m	75% (+1)		●	●	—
花岡高架橋	2,639m	81% (+2)	■	●	●	—
国縫高架橋	2,138m	41% (+1)	●	●	●	—
遊楽部高架橋	1,083m	66% (+2)	●	●	●	—
新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	73% (+0)	■	●	●	—
大新高架橋外1箇所	2,883m	73% (+1)	●	●	●	●
市渡高架橋他	461m	100% (+0)	■	■	■	■
JR委託工事						
札幌駅高架橋	799m	—	●	●	●	—

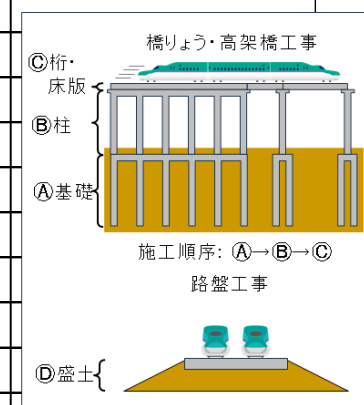

凡例 空欄:未着手 ●:施工中 ■:施工完了 —:対象なし
