


# 北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事月報①

2026(令和8)年6月1日現在

## ○トンネル工事の過去1か月間の進捗状況

トンネル区	延長 (m)	覆工 延長 (m)	掘削 延長 (m)	掘削の進捗率	過去 1か月の 掘削延長 (m)	進捗			過去1か月の工事状況等
						前々 回	前回	今回	
札幌	桑園	346	0	217	63%	2	●	●	(*)
	札幌	8,405	0	3,514	42%	139	●	●	試験掘進により掘削進行が低下。
	富丘	4,541	2,391	4,479	99%	74	●	●	新函館北斗方は概ね想定通りの進捗、札幌方の掘削は一時停止のうえ札幌工区との接続部において地盤改良施工中。
	星置	3,300	1,608	2,836	86%	41	●	●	湧水により進捗が低下。
	銭函	5,100	1,428	3,379	66%	27	●	●	2切羽で掘削中。新函館北斗方は湧水により進捗が低下。札幌方は地質不良区間を掘削中。
	石倉	4,556	1,116	3,391	74%	0	●	●	4月6日にトンネル坑内への土砂流入が発生し掘削工事を中断、応急対策実施中。
朝里	4,328	3,206	4,246	98%	0	●	●	トンネル本坑の大断面インパート部を掘削中。	
後志	天神	4,460	3,662	4,412	99%	56	●	●	
	塩谷	4,050	2,068	4,050	100%	-	-	-	
	北上沢	4,600	4,543	4,600	100%	-	-	-	
	落合	4,865	4,826	4,865	100%	-	-	-	
二ツ森	明治	3,255	2,469	3,255	100%	-	●	-	
	尾根内	4,615	3,704	4,615	100%	-	-	-	
	鹿子	4,780	4,748	4,780	100%	-	-	-	
羊蹄	比羅夫	5,569	4,291	5,156	93%	92	●	●	
	有島	4,166	1,809	2,867	69%	0	●	●	中間立坑にてビット交換が完了し、掘進開始に向けて準備中。
ニセコ	2,250	2,250	2,250	100%	-	-	-		
昆布	宮田	5,710	5,742	5,710	100%	-	-	-	※宮田トンネルを含む。
	桂台	4,800	4,769	4,800	100%	-	-	-	
内浦	幌内	5,000	4,960	5,000	100%	-	-	-	
	東川	5,000	2,504	4,468	89%	67	●	●	
	静狩	5,570	4,475	5,570	100%	-	-	-	
国縫	1,340	1,340	1,340	100%	-	-	-		
豊野	2,165	2,120	2,165	100%	-	-	-	※幌内トンネルを含む。	
立岩	豊津	2,065	2,055	2,065	100%	-	-	-	
	ルコツ	5,000	5,000	5,000	100%	-	-	-	
	山崎	4,960	4,983	4,960	100%	-	-	-	
	立岩	5,015	4,977	5,015	100%	-	-	-	
野田追	北	4,450	3,864	4,450	100%	-	-	-	
	南	3,775	3,661	3,775	100%	-	-	-	
磐石	祭礼	1,975	1,950	1,975	100%	-	-	-	
	北	3,150	3,157	3,150	100%	-	-	-	
二股	3,100	3,095	3,100	100%	-	-	-	※磐石トンネル(南)を含む。	
渡島	上ノ湯	5,300	4,751	5,300	100%	-	-	-	
	上二股	4,540	3,609	4,540	100%	-	-	-	
	北鶉	5,510	4,383	5,510	100%	-	-	-	
	南鶉	3,900	1,091	2,575	66%	65	●	●	地質不良が継続中。2切羽で掘削中。
	天狗	5,050	3,087	4,600	91%	0	●	●	台場山工区側への迎え掘りの準備中。
	台場山	3,050	815	2,176	71%	30	●	●	地質不良が継続中。3交代(24時間)体制で掘削中。
村山	5,365	5,365	5,365	100%	-	-	-		
合計	168,976	125,867	155,520	92%					

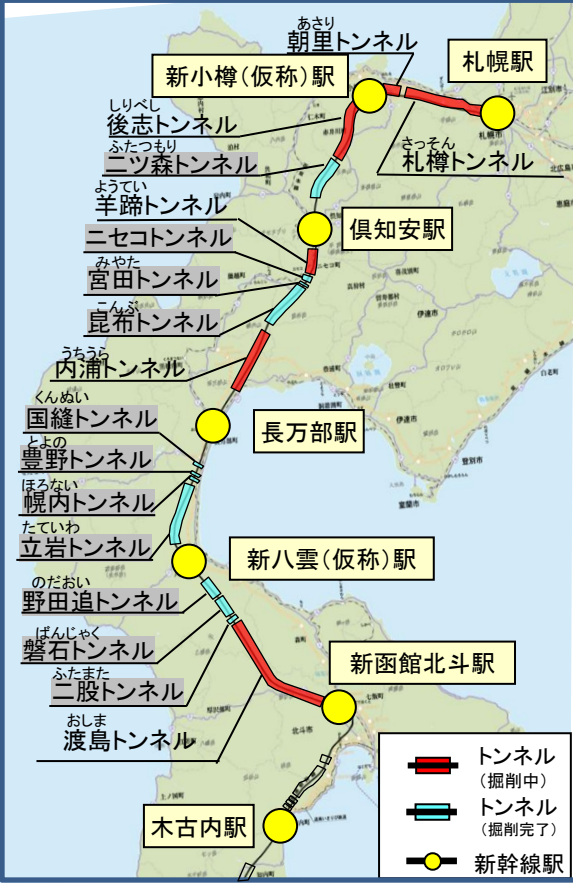

### 進捗率

	延長	契約率	掘削率
土木工事	211.9km	99%	92%

### 土木工事(トンネル、橋りょう・高架橋等)の状況

本坑掘削完了	26工区
本坑掘削中	14工区
橋りょう・高架橋等工事施工中	20工区
計	60工区

### 発生土受入地確保状況

	対策土	無対策土	合計
確保率	93%	100%	98%


※現時点で想定している発生量に対する確保割合。発生量は地質や工事の状況により変更となる可能性があります。

※当月におけるトンネルの掘削が、●概ね想定通り、○想定を下回り難航、●停止中(計画に則る停止を除く)であることを示します。  
 ※黄色のバーは、2024(令和6)年5月時点において3~4年程度の遅れが生じており、工程を重点的に管理している工区を示します。  
 ※灰色のバーは掘削が完了している工区です。  
 ※札幌トンネル札幌工区の覆工延長は二次インパート延長を示します。 \*1 過去1か月の掘削延長は、トンネル区間の進捗率から換算しています。



## 橋りょう、高架橋等の工事

工区名	延長	進捗率 (先月比)	工事状況			
			①	②	③	④
札幌車両基地高架橋	1,344m	64% (+2)	●	●	●	—
札幌トンネル(桑園)他	659m	56% (+2)	■	●	●	●
新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	55% (+0)	●	●	●	—
明治高架橋他	976m	65% (+4)	●	●	●	—
琴平高架橋	3,395m	45% (+2)	●	●	●	—
倶知安駅高架橋	3,160m	58% (+2)	●	●	●	—
岩尾別高架橋	2,354m	67% (+1)	●	●	●	—
宮田高架橋外1箇所	1,136m	55% (+0)	●	●	●	●
静狩路盤 ※高架橋を含む	4,390m	58% (+2)	●	●	●	●
共立路盤 ※高架橋を含む	3,921m	87% (+1)	●	●	●	●
栄原高架橋	2,534m	86% (+2)	●	●	●	—
長万部駅高架橋	2,319m	32% (+3)	●	●	●	—
平里高架橋他	1,838m	82% (+3)	■	■	●	—
中ノ沢高架橋	1,876m	85% (+2)	■	■	●	—
花岡高架橋	2,639m	89% (+1)	■	■	●	—
国縫高架橋	2,138m	47% (+3)	●	●	●	—
遊楽部高架橋	1,083m	66% (+0)	●	●	●	—
新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	86% (+0)	■	●	●	—
大新高架橋外1箇所	2,883m	80% (+2)	●	●	●	●
市渡高架橋他	461m	100% (+0)	■	■	■	■
JR委託工事						
札幌駅高架橋	799m	—	■	●	●	—

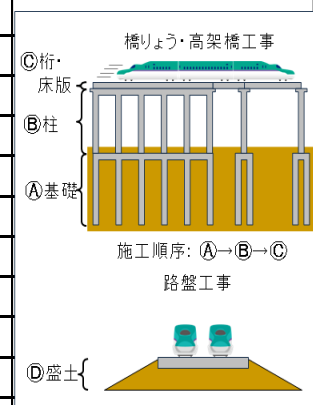

凡例 空欄:未着手 ●:施工中 ■:施工完了 —:対象なし
