




2025(令和7)年6月1日現在

※当月におけるトンネルの掘削が、●概ね想定通り、●想定を下回り難航、●停止中(計画に則る停止を除く)であることを示します。
 ※■は、2024(令和6)年5月時点において3~4年程度の遅れが生じており、工程を重点的に管理している工区を示します。
 ※■のバーは掘削が完了している工区です。
 ※札幌トンネル札幌工区の覆工延長は二次インバート延長を示します。 *断面を分割して掘削しているため、過去1か月の掘削延長が0mになっています。

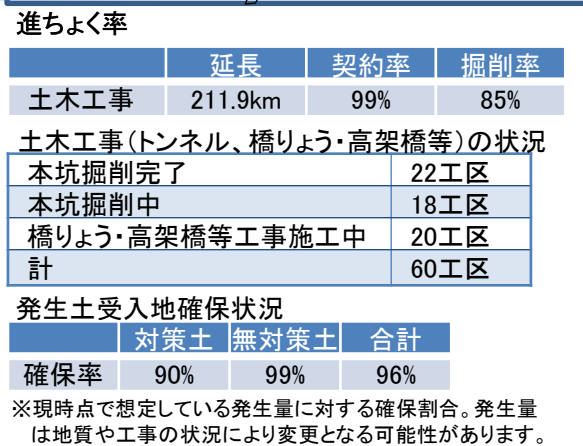

橋りょう・高架橋工事

④桁・床版

③柱

②基礎

①盛土

施工順序: ①→②→③→④

路盤工事

④盛土

札幌駅高架橋	799m	—	●	●	●	—
--------	------	---	---	---	---	---

設備工事進ちょく状況

工事種類	工区名	工事状況
軌道工事	基準器設置	基準器設置工事中
軌道工事	渡島南軌道敷設	準備中
軌道工事	渡島北軌道敷設	準備中
軌道工事	二セコ軌道敷設	準備中
軌道工事	後志レール溶接	準備中
