

北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進捗状況

渡島トンネル(台場山)

先進調査ボーリング作業状況



ニセコトンネル
器材坑施工状況



野田追トンネル

インバート(トンネル底盤部)本体工



ニツ森トンネル(尾根内)
トンネル掘削作業状況




立岩トンネル(ルコツ)

トンネル掘削作業状況



朝里トンネル

本坑・作業坑交差部状況

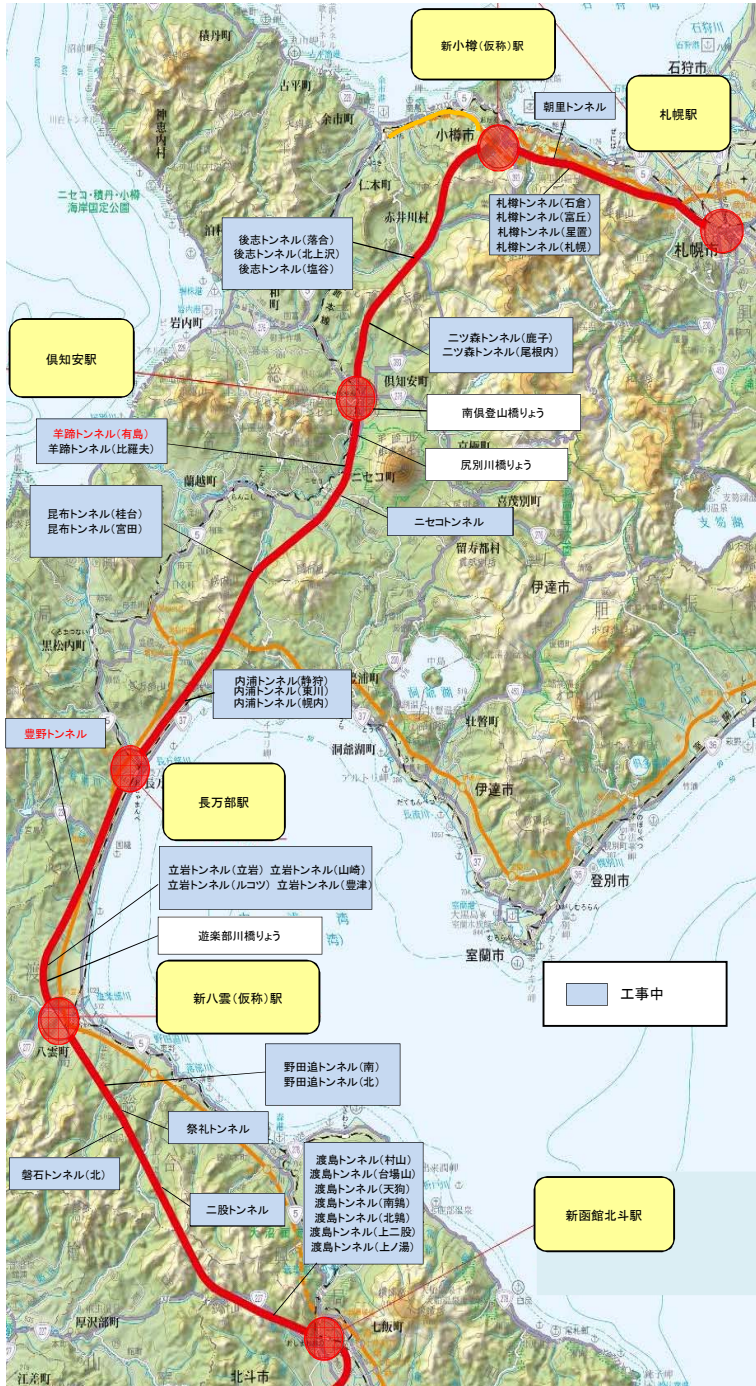

進捗率

路盤	延長	契約率	掘削率※
	211.9km	73.7%	16.0%

※掘削率はトンネル総延長に対する掘削済延長の比率

●工区状況

- 本坑掘削中 **18工区**
- 斜坑・横坑掘削中 **3工区**
- 準備中 **14工区**
- 計 **35工区**

路盤の内トンネル工事進捗状況

工区名	総延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
渡島トンネル(村山)	5,365m	4,562m	85.0%	3,663m	
渡島トンネル(台場山)	3,500m	105m	0.0%	0m	
渡島トンネル(天狗)	4,600m	481m	10.5%	0m	
渡島トンネル(南鶴)	4,400m	0m	0.0%	0m	斜坑掘削中、992m/1,203m
渡島トンネル(北鶴)	5,000m	605m	12.1%	0m	
渡島トンネル(上二股)	4,540m	0m	0.0%	0m	
渡島トンネル(上ノ湯)	5,270m	0m	0.0%	0m	
二股トンネル	3,089m	0m	0.0%	0m	
磐石トンネル(北)	2,986m	0m	0.0%	0m	
祭礼トンネル	1,980m	0m	0.0%	0m	
野田追トンネル(南)	3,675m	944m	25.7%	0m	
野田追トンネル(北)	4,490m	2,288m	50.9%	1,113m	
立岩トンネル(立岩)	5,015m	2,711m	54.1%	1,709m	
立岩トンネル(山崎)	4,960m	0m	0.0%	0m	横坑掘削中、1,075m/1,675m
立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	290m	5.8%	0m	
立岩トンネル(豊津)	2,060m	0m	0.0%	0m	
豊野トンネル	2,155m	0m	0.0%	0m	
内浦トンネル(静狩)	5,570m	37m	0.7%	0m	
内浦トンネル(東川)	5,000m	0m	0.0%	0m	
内浦トンネル(幌内)	5,000m	200m	4.0%	0m	
昆布トンネル(桂台)	4,800m	3,734m	77.8%	2,623m	
昆布トンネル(宮田)	5,610m	3,528m	62.9%	1,959m	
ニセコトンネル	2,270m	272m	12.0%	0m	
羊蹄トンネル(有島)	4,181m	0m	0.0%	0m	
羊蹄トンネル(比羅夫)	5,569m	0m	0.0%	0m	シールドマシン組立中
ニツ森トンネル(鹿子)	4,780m	2,153m	45.0%	840m	
ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	462m	10.0%	0m	
後志トンネル(落合)	4,865m	1,978m	40.7%	1,234m	
後志トンネル(北上沢)	4,600m	2,204m	47.9%	1,334m	
後志トンネル(塩谷)	4,050m	0m	0.0%	0m	斜坑掘削中、287m/1,992m
朝里トンネル	4,325m	369m	8.5%	0m	
札幌トンネル(石倉)	4,504m	0m	0.0%	0m	
札幌トンネル(星置)	4,400m	0m	0.0%	0m	
札幌トンネル(富丘)	4,500m	0m	0.0%	0m	
札幌トンネル(札幌)	8,406m	0m	0.0%	0m	
