

# 北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進捗状況

## 渡島トンネル(台場山) トンネル器材坑掘削状況



ニセコトンネル

長尺先受け工 薬液注入状況



## 野田追トンネル

インバート(トンネル底盤部)本体工



ニツ森トンネル(尾根内)

トンネル掘削作業状況




## 立岩トンネル(ルコツ)

トンネル掘削作業状況



朝里トンネル

本坑・作業坑交差部状況

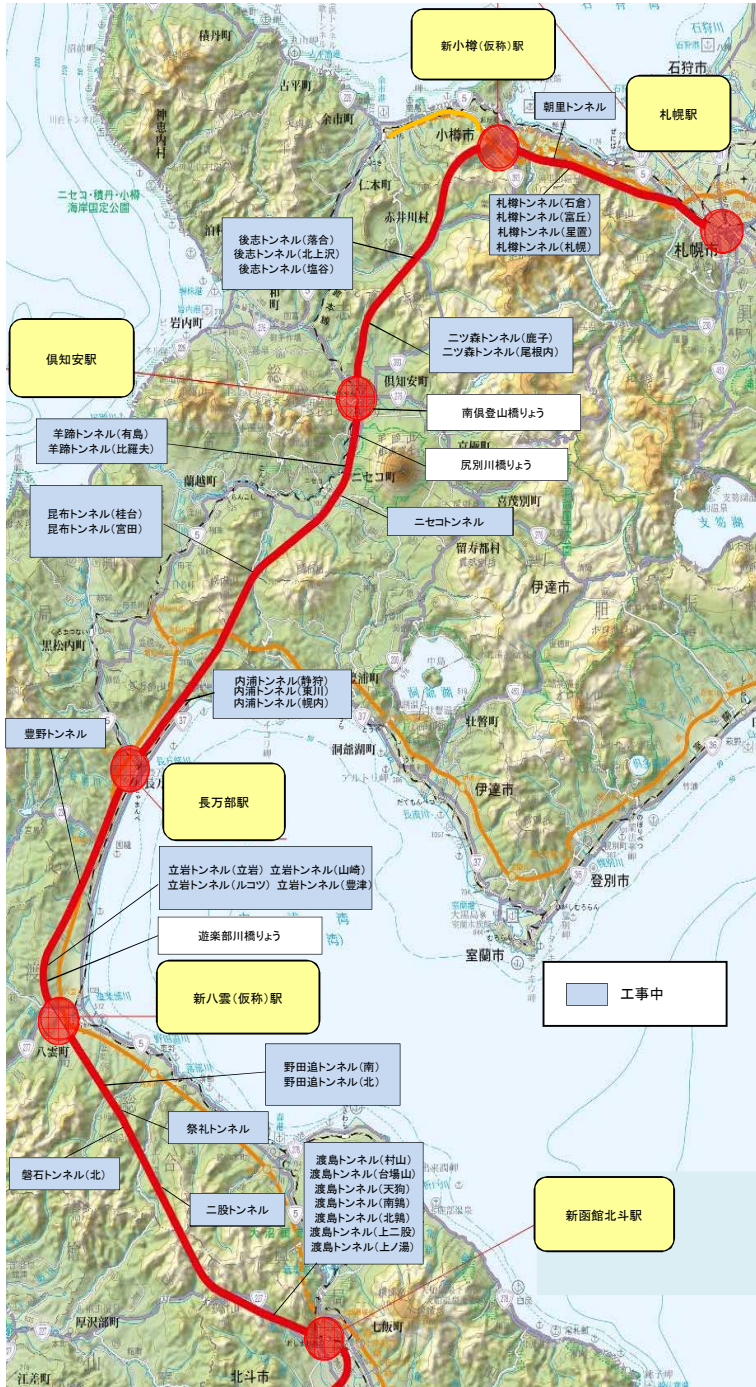

### 路盤の内トンネル工事進捗状況

工区名	総延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
渡島トンネル(村山)	5,365m	4,595m	85.6%	3,789m	
渡島トンネル(台場山)	3,500m	179m	5.1%	0m	
渡島トンネル(天狗)	4,600m	527m	11.4%	0m	
渡島トンネル(南鶉)	4,400m	0m	0.0%	0m	斜坑掘削中、1,008m/1,216m
渡島トンネル(北鶉)	5,000m	720m	14.4%	0m	
渡島トンネル(上二股)	4,540m	0m	0.0%	0m	
渡島トンネル(上ノ湯)	5,270m	0m	0.0%	0m	
二股トンネル	3,089m	0m	0.0%	0m	
磐石トンネル(北)	2,986m	0m	0.0%	0m	
祭礼トンネル	1,980m	0m	0.0%	0m	
野田追トンネル(南)	3,675m	1,068m	29.1%	0m	
野田追トンネル(北)	4,490m	2,361m	52.6%	1,113m	
立岩トンネル(立岩)	5,015m	2,788m	55.6%	1,825m	
立岩トンネル(山崎)	4,960m	0m	0.0%	0m	横坑掘削中、1,177m/1,675m
立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	324m	6.5%	0m	
立岩トンネル(豊津)	2,060m	0m	0.0%	0m	
豊野トンネル	2,155m	0m	0.0%	0m	
内浦トンネル(静狩)	5,570m	101m	1.8%	0m	
内浦トンネル(東川)	5,000m	0m	0.0%	0m	
内浦トンネル(幌内)	5,000m	289m	5.8%	0m	
昆布トンネル(桂台)	4,800m	3,818m	79.5%	2,738m	
昆布トンネル(宮田)	5,610m	3,633m	64.8%	2,075m	
ニセコトンネル	2,270m	325m	14.3%	0m	
羊蹄トンネル(有島)	4,181m	0m	0.0%	0m	
羊蹄トンネル(比羅夫)	5,569m	0m	0.0%	0m	シールドマシン発進準備中
ニツ森トンネル(鹿子)	4,780m	2,282m	47.7%	911m	
ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	562m	12.2%	0m	
後志トンネル(落合)	4,865m	1,978m	40.7%	1,234m	
後志トンネル(北上沢)	4,600m	2,277m	49.5%	1,407m	
後志トンネル(塩谷)	4,050m	0m	0.0%	0m	斜坑掘削中、408m/1,992m
朝里トンネル	4,325m	470m	10.9%	0m	
札幌トンネル(石倉)	4,504m	0m	0.0%	0m	
札幌トンネル(星置)	4,400m	0m	0.0%	0m	
札幌トンネル(富丘)	4,500m	0m	0.0%	0m	
札幌トンネル(札幌)	8,406m	0m	0.0%	0m	

### 進捗率

路盤	延長	契約率	掘削率※
	211.9km	73.7%	16.8%

※掘削率はトンネル総延長に対する掘削済延長の比率

### ●工区状況

本坑掘削中 **18工区**

斜坑・横坑掘削中 **3工区**

準備中 **14工区**

計 **35工区**
