


北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進ちょく状況

令和5年9月1日現在

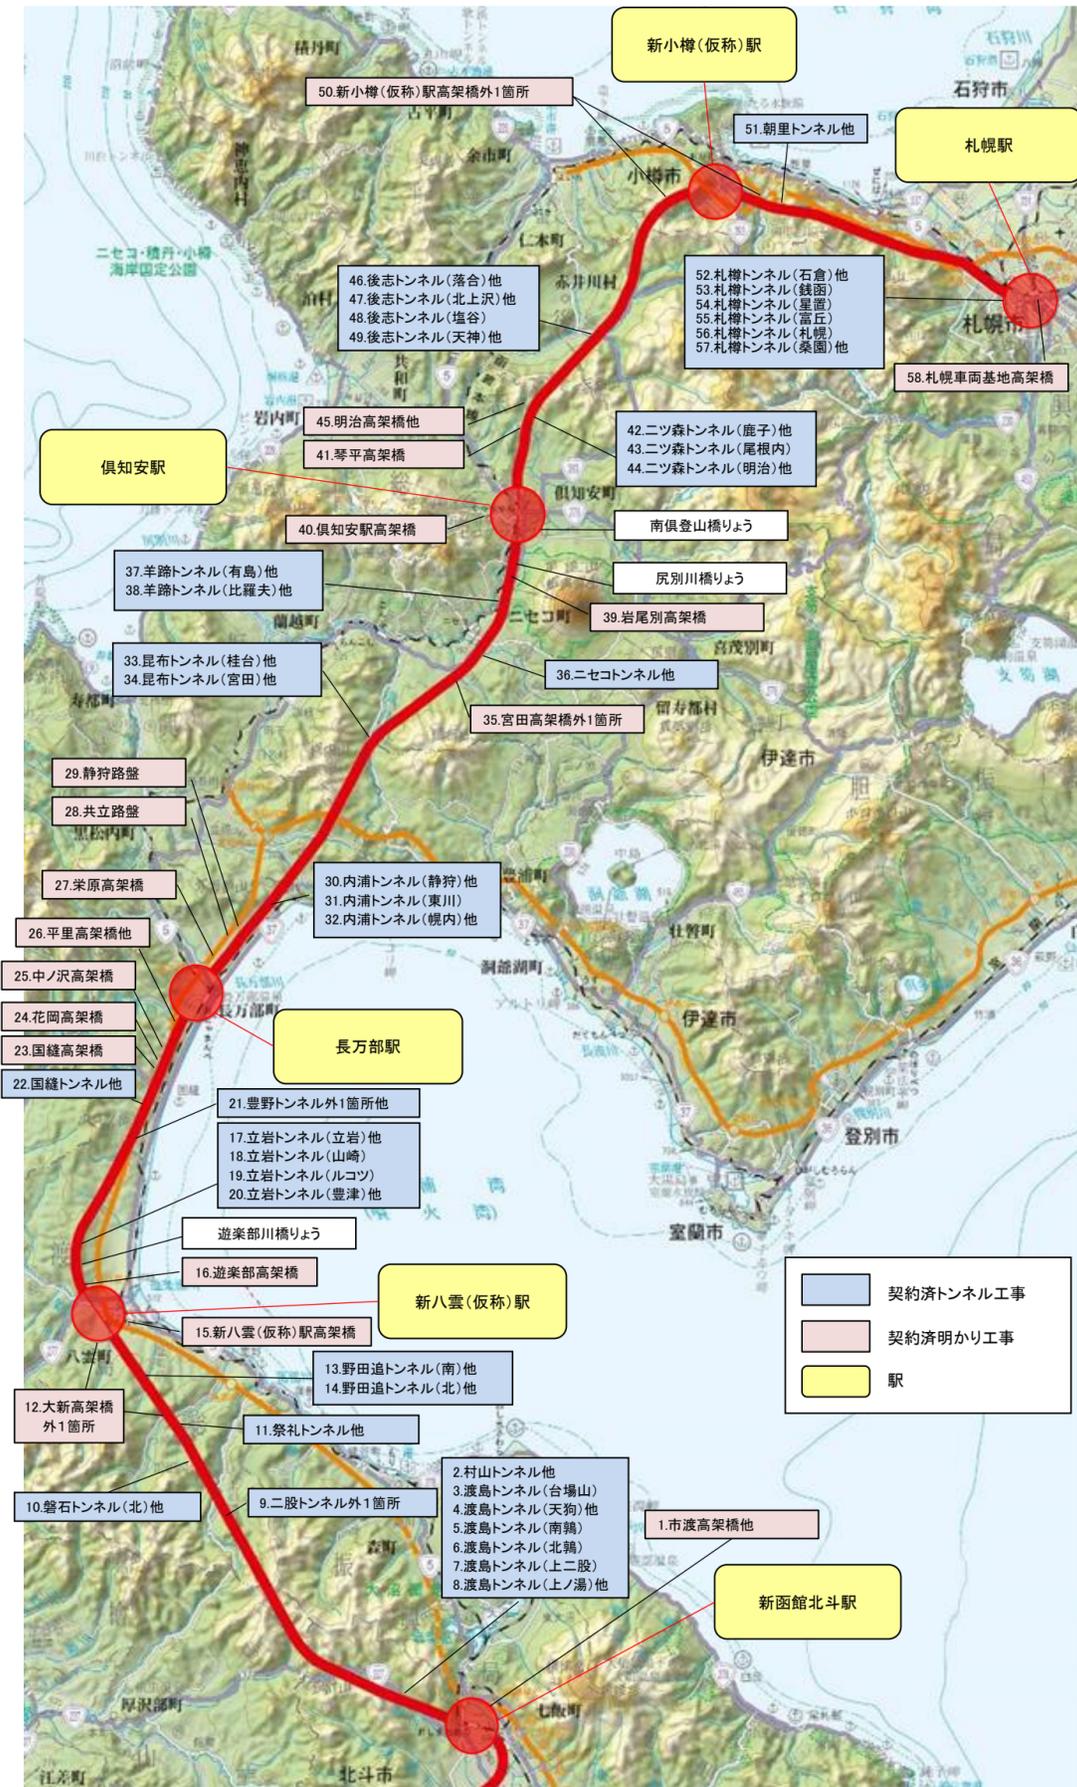

トンネル工事進ちょく状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,172m	33%	147m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	3,092m	67%	1,649m	
5	渡島トンネル(南鶉)	4,400m	1,010m	23%	0m	
6	渡島トンネル(北鶉)	5,000m	4,536m	91%	3,353m	
7	渡島トンネル(上二股)	4,540m	2,750m	61%	0m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,310m	3,157m	59%	2,441m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,651m	86%	2,004m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	2,370m	75%	1,386m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,836m	磐石トンネルと一本化 ※3
13	野田追トンネル(南)他	3,675m	3,652m	99%	2,192m	
14	野田追トンネル(北)他	4,550m	4,045m	89%	3,308m	
17	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,977m	
18	立岩トンネル(山崎)	4,960m	3,891m	78%	2,531m	
19	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	5,000m	100%	4,070m	
20	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	1,866m	90%	1,029m	
21	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	1,775m	82%	1,149m	幌内トンネルを含む
22	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	692m	
30	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	3,847m	69%	2,799m	
31	内浦トンネル(東川)	5,000m	2,224m	44%	884m	
32	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	5,000m	100%	3,986m	
33	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
34	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
36	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,250m	
37	羊蹄トンネル(有島)他	4,166m	1,497m	36%	264m	
38	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,404m	61%	2,540m	
42	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
43	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	3,497m	76%	2,275m	
44	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	821m	25%	11m	
46	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,865m	100%	4,605m	
47	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
48	後志トンネル(塩谷)	4,050m	2,094m	52%	288m	
49	後志トンネル(天神)他	4,460m	1,997m	45%	1,298m	
51	朝里トンネル他	4,328m	3,695m	85%	2,295m	
52	札幌トンネル(石倉)他	4,506m	1,126m	25%	0m	
53	札幌トンネル(銭函)	4,000m	740m	19%	0m	
54	札幌トンネル(星置)	4,400m	326m	7%	0m	
55	札幌トンネル(富丘)	4,500m	811m	18%	0m	
56	札幌トンネル(札幌)	8,446m	1,429m	17%	0m	
57	札幌トンネル(桑園)他	346m	70m	20%	0m	進ちょく率から求めた換算値
合計		168,926m	114,242m	-	81,421m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋脚工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,883m	準備中
15	新八雲(仮称)駅高架橋	1,178m	準備中
16	遊楽部高架橋	1,083m	準備中
23	国縫高架橋	2,138m	準備中
24	花岡高架橋	2,639m	準備中
25	中ノ沢高架橋	1,876m	準備中
26	平里高架橋他	1,838m	高架橋基礎、橋脚基礎工事中
27	栄原高架橋	2,534m	準備中
28	共立路盤	3,921m	準備中
29	静狩路盤	4,390m	準備中
35	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋基礎工事中
39	岩尾別高架橋	2,354m	高架橋基礎工事中
40	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋基礎工事中
41	琴平高架橋	3,395m	準備中
45	明治高架橋他	976m	高架橋基礎、橋脚基礎工事中
50	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	高架橋基礎工事中
57	札幌トンネル(桑園)他	659m	高架橋基礎工事中
58	札幌車両基地高架橋	1,344m	高架橋基礎工事中

進ちょく率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	98%	68%

●工事状況

本坑掘削完了	12工区
本坑掘削中	28工区
明かり工事施工中	8工区
準備中	10工区
計	58工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

1.市渡高架橋他

橋脚工事状況



18.立岩トンネル(ルコツ)

防水工状況



30.内浦トンネル(幌内)他

坑内状況



41.ニツ森トンネル(尾根内)

覆工状況



47.後志トンネル(天神)他

覆工状況

