


北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進ちょく状況

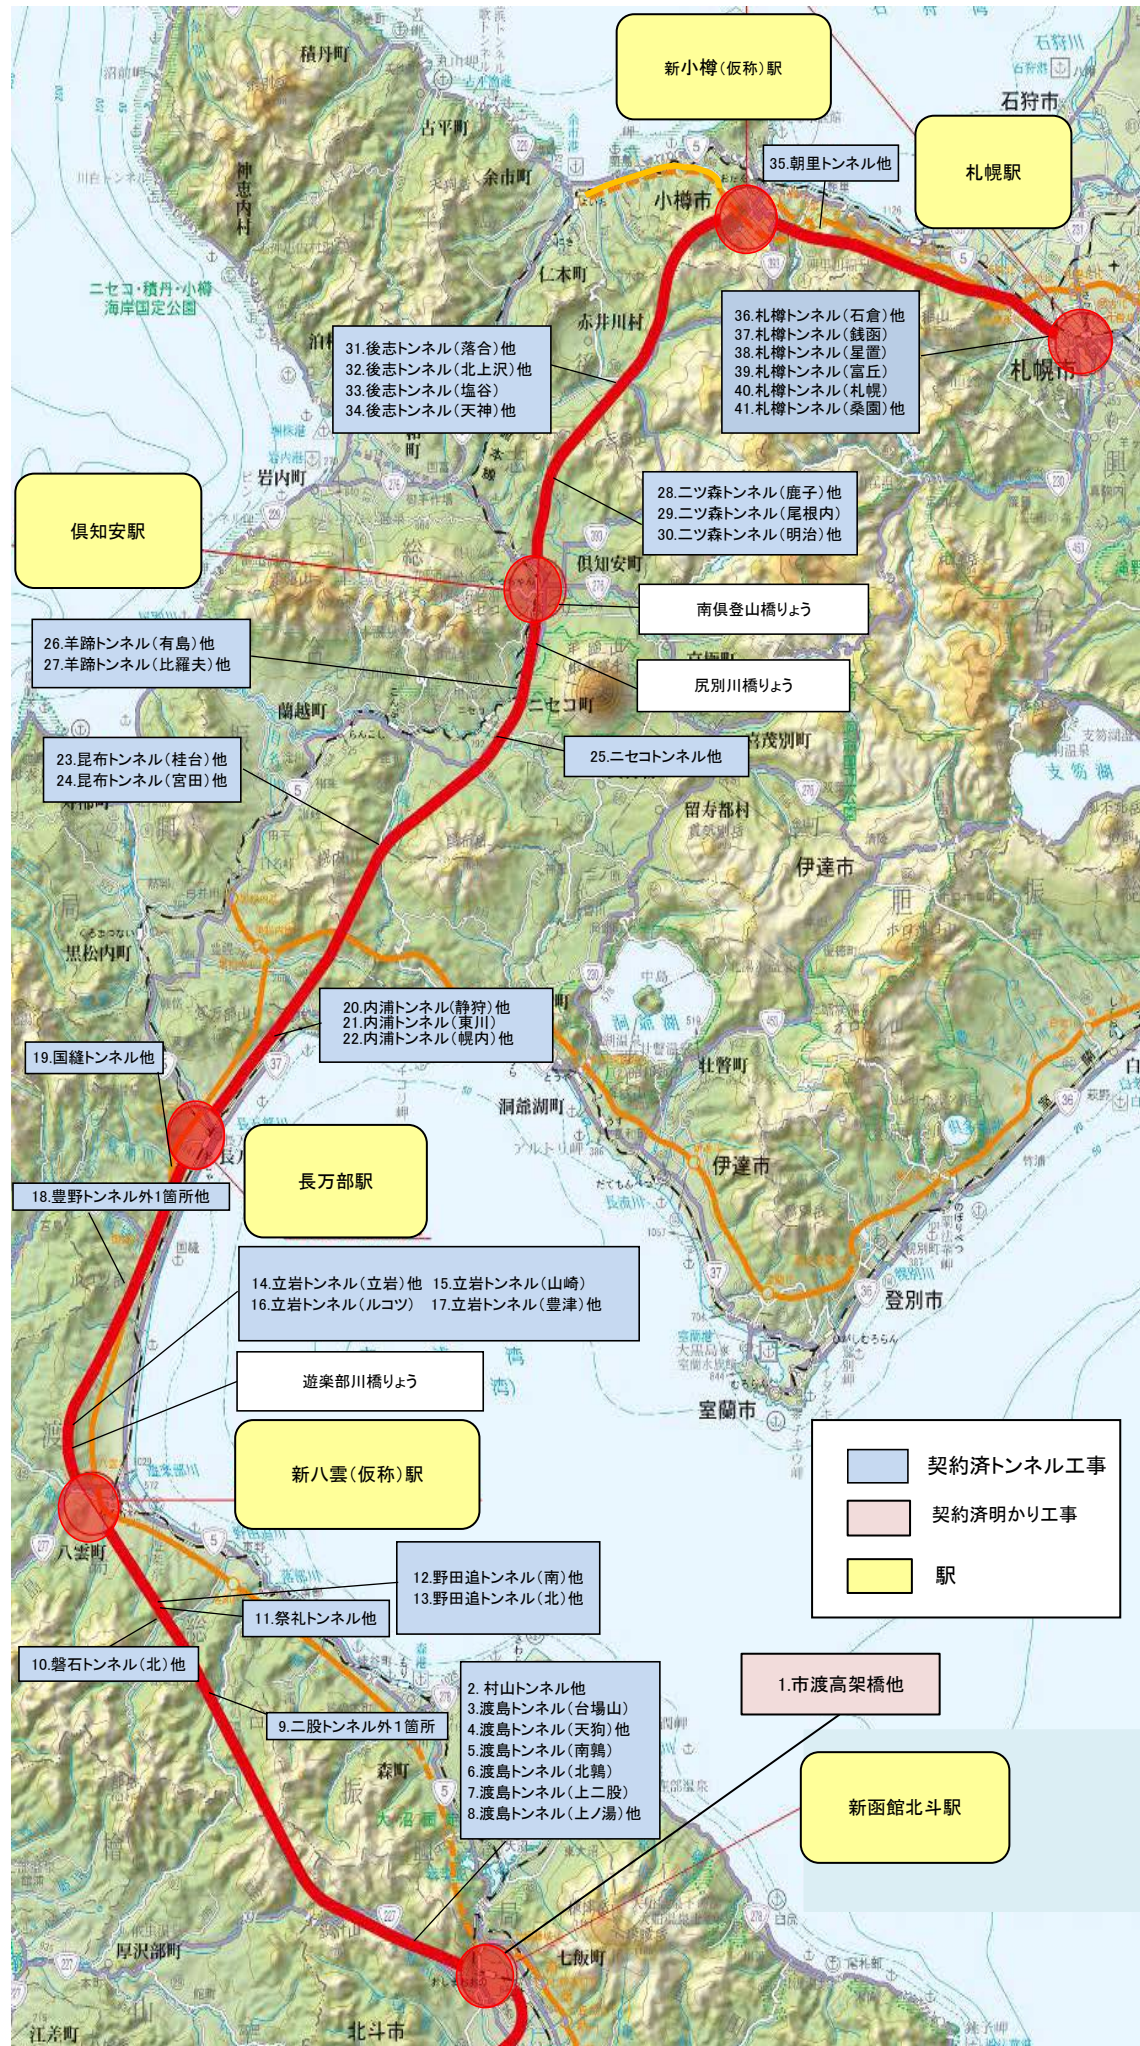

トンネル工事進ちょく状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)	3,500m	1,008m	29%	0m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	2,295m	50%	1,386m	
5	渡島トンネル(南鶉)	4,400m	551m	13%	0m	
6	渡島トンネル(北鶉)	5,000m	3,535m	71%	2,152m	
7	渡島トンネル(上二股)	4,540m	959m	21%	0m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,265m	2,340m	44%	1,082m	
9	二股トンネル外1箇所	3,115m	1,563m	50%	753m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	1,045m	33%	0m	
11	祭礼トンネル他	1,980m	1,967m	99%	966m	磐石トンネルと一本化 ※3
12	野田追トンネル(南)他	3,675m	3,279m	89%	2,003m	
13	野田追トンネル(北)他	4,490m	3,992m	89%	2,888m	
14	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,208m	
15	立岩トンネル(山崎)	4,960m	2,240m	45%	1,019m	
16	立岩トンネル(ルコツ)	5,000m	3,982m	80%	3,100m	
17	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	1,061m	51%	0m	
18	豊野トンネル外1箇所他	2,105m	1,103m	52%	267m	幌内トンネルを含む
19	国縫トンネル他	1,340m	955m	71%	0m	
20	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	2,547m	46%	1,524m	
21	内浦トンネル(東川)	5,000m	1,166m	23%	12m	
22	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	3,820m	76%	2,412m	
23	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,764m	
24	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,621m	宮田トンネルを含む
25	ニセコトンネル他	2,270m	2,250m	99%	1,431m	※3
26	羊蹄トンネル(有島)他	4,181m	169m	4%	0m	
27	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,404m	61%	2,135m	
28	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
29	ニツ森トンネル(尾根内)	4,615m	2,664m	58%	1,464m	
30	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	0m	0%	0m	
31	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,803m	99%	4,012m	
32	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,084m	
33	後志トンネル(塩谷)	4,050m	1,241m	31%	288m	
34	後志トンネル(天神)他	4,460m	959m	22%	240m	
35	朝里トンネル他	4,325m	2,882m	67%	1,341m	
36	札樽トンネル(石倉)他	4,504m	702m	16%	0m	
37	札樽トンネル(銭函)	4,000m	0m	0%	0m	斜坑掘削中 10m/397m
38	札樽トンネル(星置)	4,400m	0m	0%	0m	斜坑掘削中 0m/570m
39	札樽トンネル(富丘)	4,500m	0m	0%	0m	斜坑掘削中 462m/900m
40	札樽トンネル(札幌)	8,412m	107m	1%	0m	
41	札樽トンネル(桑園)他	737m	0m	0%	0m	
合計		169,168m	88,859m	-	59,261m	※1

明かり工事進ちょく状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	準備中

進ちょく率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	81%	53%

●工事状況

本坑掘削完了	8工区
本坑掘削中	29工区
作業坑掘削中	3工区
準備中	1工区
計	41工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長169,168mに対する掘削済延長の比率
 ※3: 掘削率が100%未達の理由は、明かり巻き未施工のため。地山部の掘削は完了。

2.村山トンネル他
坑口状況



16.立岩トンネル(ルコツ)
防水工打設状況



22.内浦トンネル(幌内)他
坑内状況



28.ニツ森トンネル(鹿子)他
覆工完了状況



34.後志トンネル(天神)
FILM状況

